

15. března 2017

NABÍDKA 170313

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo.

Projekt: UBYTOVNA



Pro:

OBEC ŘÍČANY

Kontakt: Ing. Jan Studený
Telefon:
Telefax:
Mobil: +420 724 303 746
e-mail: starosta@ricanyubrno.cz

Zpracoval:

KOMA MODULAR, s.r.o.


Kontakt: Monika Becková, DiS.
Telefon: +420 577 007 760
Telefax: +420 577 452 839
Mobil: +420 702 187 069
e-mail: monika.beckova@koma-modular.cz

Vážený pane starosto,

zasílám Vám dodatek k cenové nabídce na ubytovnu dle Vašeho upraveného zadání.

Skladba nabídky:

1. Naše řešení
2. Záruka
3. Dodací termíny
4. Investice
5. Platební podmínky
6. Reference
7. Přílohy:
 - Schematický půdorys V5

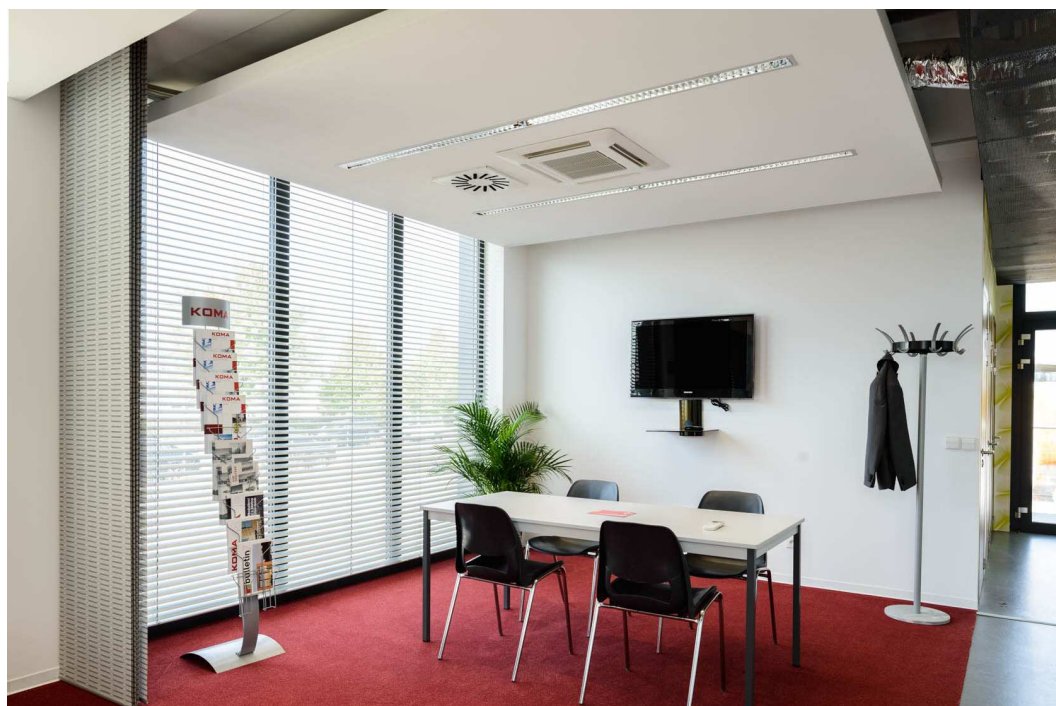

T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

1. NAŠE ŘEŠENÍ / výrobní řada StandardLine

RÁMOVÁ KONSTRUKCE

Konstrukce rámu je vyrobena z válcovaných a ohýbaných žárově pozinkovaných ocelových profilů tloušťky plechu 2-5 mm, stohovatelný do 2 podlaží.

Pozinkovaný rám: 7500 x 2990 x 3100 mm (sv.v. = 2600 mm)

Výhoda: Jako jediní vyrábíme rámy kontejnerů z žárově zinkované oceli. Žárově zinkování představuje extrémně dlouhodobou protikorozi ochranu. Ochrání před korozí déle než 40 let, šetří náklady na opakované natírání rámu.

NOSNOST

Nosnost podlahy 250 kg/m²

Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m²

ZATEPLENÍ OBJEKTU

Splňující Průkaz energetické náročnosti C, hodnoty součinitele tepelného prostupu jsou:

- Podlaha: izolace z minerální vaty tl. 120 mm a styroduru tl. 30 mm, U = 0,333 W/m².K
- Stěny: izolace z minerální vaty tl. 140 mm, U = 0,299 W/m².K
- Vnitřní stěny: izolace z minerální vaty tl. 60 mm, U = 0,626 W/m².k
- Střecha: izolace z minerální vaty tl. 220 mm, U = 0,186 W/m².K

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Stěny: 30 minut, materiálová skladba DP3

Strop: 15 minut, materiálová skladba DP3

hasicí přístroje: nejsou součástí dodávky

hydrant: není součástí dodávky

PODLAHY

Skladba podlahy:

- **ŘEZ PODLAHOU C3 PENB C**
- Podlahovina PVC 2,5 mm
- Cementotřísková deska CETRIS 22 mm
- Parotěsná fólie
- Tepelná izolace – minerální vata 120 mm
- Příčný nosník ocelový zinkovaný
- Uzavírací trapézový podlahový plech 0,4 mm
- Tepelná izolace – STYRODUR 30 mm
- Obvodový nosník ocelový zinkovaný

STĚNY

Skladba stěn:

- **ŘEZ STĚNOU C3**
- Plech fasádní profilovaný 0,55 mm
- Dřevěný rastr
- Tepelná izolace – minerální vata 140 mm, 60 mm
- Parotěsná fólie
- Laminovaná dřevotřísky 10 mm (voděodolná deska v koupelně)

VNITŘNÍ PŘÍČKY

Příčky jsou vyrobeny z dřevěného rastru s izolací z minerální vaty. Dřevěný rastr je z obou stran pokryt deskami dle požadavků zákazníka. Příčka je z obou stran pokrytá deskami dle požadavků zákazníka.

- Příčka tl. 75 mm, izolace 40 mm minerální vaty
- Desky z laminované dřevotřísky tl. 10 mm (voděodolné desky v koupelně)

T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

STŘECHA	<p>Skladba střechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ŘEZ STŘECHOU C3 - Horní rám – ocelový zinkovaný profil - Trapézový plech střešní, pozinkovaný 0,7 mm - Příčný nosník ocelový zinkovaný - Tepelná izolace – minerální vata 220 mm - Dřevěný hranol - Parotěsná fólie - Laminovaná dřevotříska 10 mm (voděodolná deska v koupelně)
VNĚJŠÍ DVEŘE	plechové dveře v odstínu dle RAL s ocelovými zárubněmi
VNITŘNÍ DVEŘE	bílé s ocelovými zárubněmi
OKNA	plastová okna sklopná v koupelně, plastové pětikomorové profily, dvojitě zasklení, čiré sklo, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, bez venkovních plastových rolet / otevíravo-sklopná dovnitř, plastové pětikomorové profily, dvojitě zasklení, čiré sklo, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, bez venkovních plastových rolet
VYTÁPĚNÍ	elektrický přímotop AEG
VZDUCHOTECHNIKA	<p>Větrání je řešeno přirozenou cestou - okny</p> <p>Větrání v místnostech se sanitárním vybavením je nucené pomocí ventilátorů v odpovídajícím výkonu.</p> <p>Klimatizace není součástí nabídky.</p>
SANITÁRNÍ KERAMIKA	<p>Standard WC, držák toaletního papíru a háček na ručník plastový. Keramika od výrobce Cersanit, typ President.</p> <p>Umyvadlo š. 550 mm na studenou a teplou vodu, zrcadlo 300x400 mm, keramická polička a plastový háček na ručník. Keramika od výrobce Cersanit, typ President.</p> <p>Umývatko š. 450 mm na studenou a teplou vodu</p> <p>Sprchová kabina z jednolitého plastu s povrchovou glazurou vysoké tepelné, chemické a mechanické odolnosti. Bílé provedení, závěs.</p>
OHŘEV TUV	<p>Elektrický bojler EWH Trend</p> <p>Průtokový ohřívač</p>
ROZVODY VODY	<p>Rozvody vody a odpadů jsou zadeklované.</p> <p>Rozvody vody jsou vedeny v plastových trubkách bez izolace, rozvody odpadů v plastových trubkách.</p> <p>Připojení vody a odpadů je vedeno šachtou v podlaze.</p>
OSTATNÍ	Minikuchyňka Limatec MK 100 od německého výrobce je součástí nabídky. Kuchyňka má nerezový dřez s odkládací plochou, dvě varné plotýnky, bílá plechová dvířka. Pod varnými plotýnkami je vestavěná 4* lednička značky LIEBHERR, třída energetické úspornosti A.
FASÁDA	Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva RAL 7040

T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

2. ZÁRUKA

- 96 měsíců na celopozinkovaný rám
- 24 měsíců na ostatní zařízení

Jako jediní standardně vyrábíme rámy z žárově zinkovaných plechů s nadstandardní životností.

3. DODACÍ TERMÍNY

- dle dohody

4. INVESTICE

Položky:	Investice v Kč bez DPH
Moduly	885 000 Kč
Montáž	v ceně
Doprava Vizovice - Říčany u Brna	v ceně
Celkem	885 000 Kč

Platnost nabídky: 30 kalendářních dnů

V ceně není zahrnuto:

- vybudování základů pro stavbu
- vyvedení přívodů vody a elektřiny na pozemku
- jeřáb potřebný ke složení kontejnerů na místě vykládky
- kontejner na odpad (při montáži)

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

60% záloha při objednávce

30% záloha před vydáním

10% doplatek se splatností 10 dnů od data dodání nebo dle smlouvy

6. REFERENCE

Reference dle témat naleznete na našich internetových stránkách <http://www.koma-modular.cz/> → [Reference](#) (v horní tmavě šedé liště).

7. PŘÍLOHY

- Schematický půdorys V5

Budeme se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,

Monika Becková









T +420 577 007 711 ústředna / reception
F +420 577 452 837
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@container.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

PŮDORYS 1:50

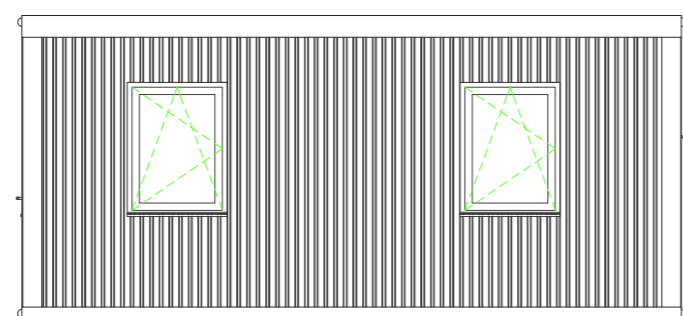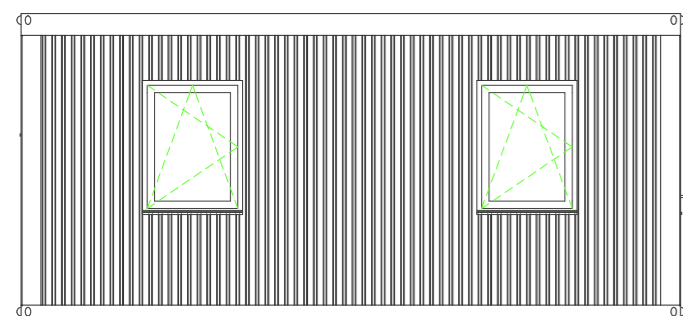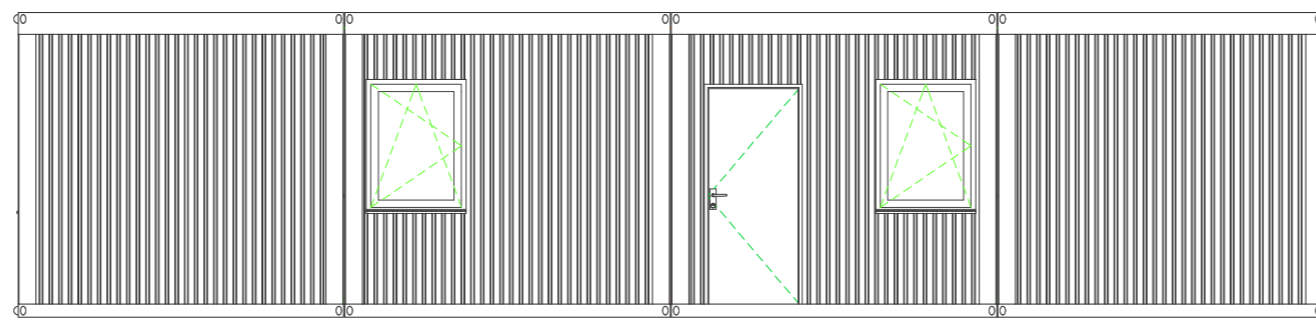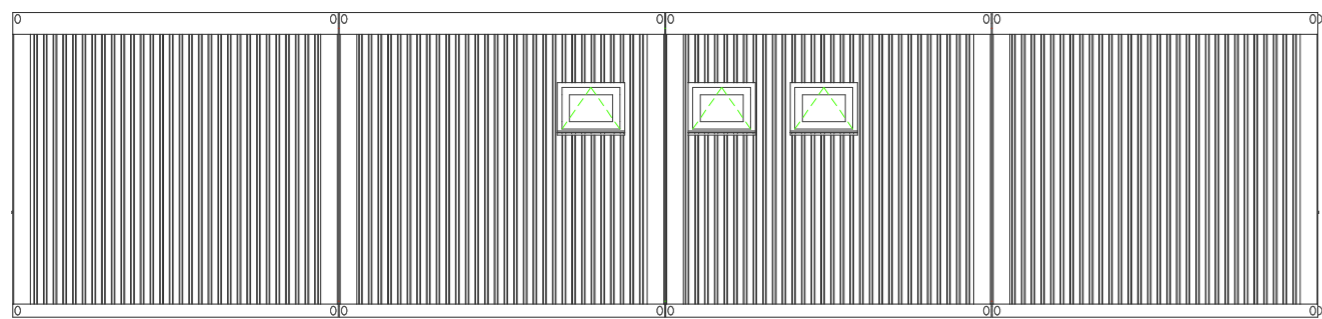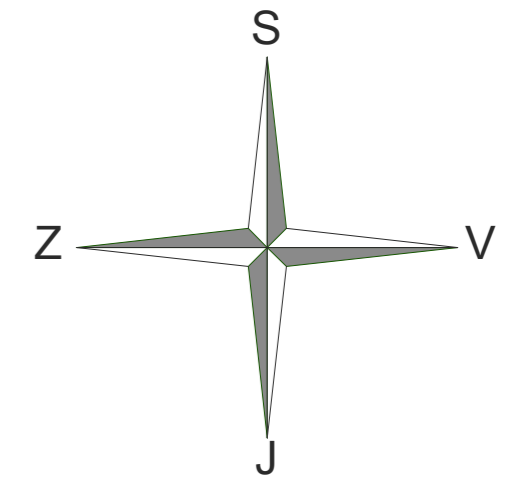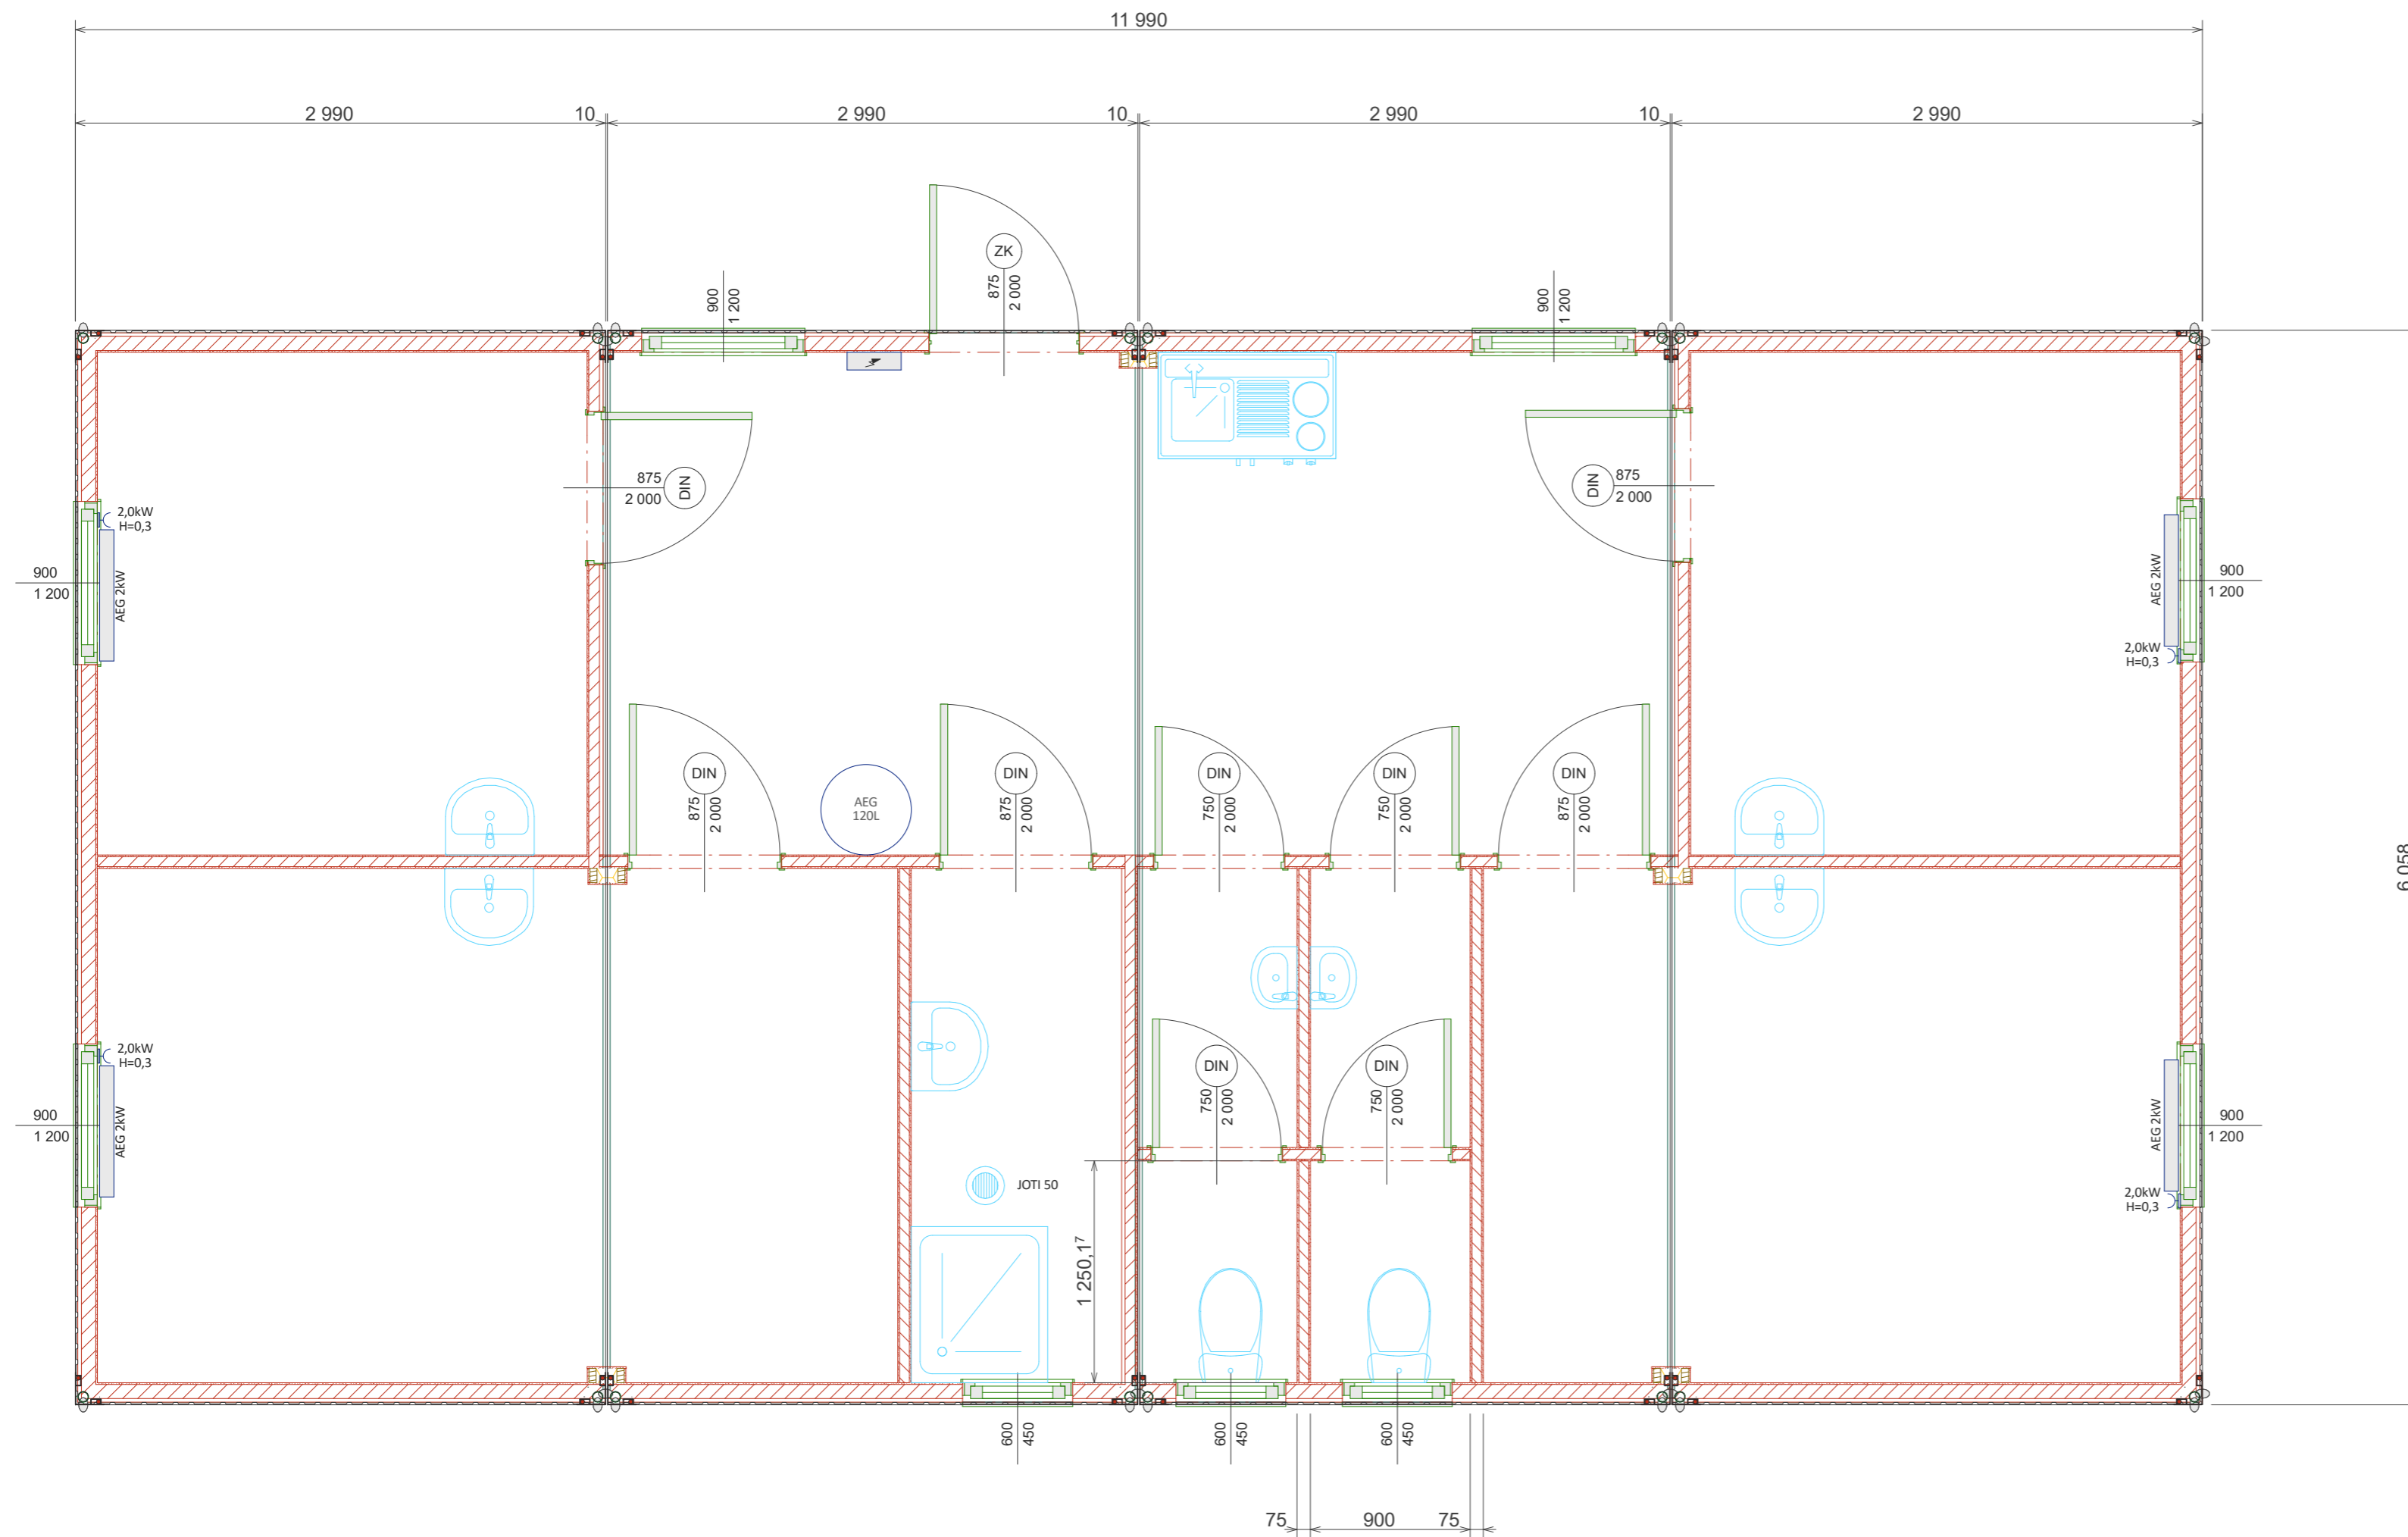

KOMA

KOMA MODULAR s.r.o.
www.koma-modular.cz

Zákazník:
Obec Říčany
Ulice:
Město:
PSČ:
Země: Česká republika

Název projektu:
UBYTOVNA

Typ výkresu: Nabídka
Varianta: V5

Zpracoval: Becková
Datum: 15.03.2016

NABÍDKA ČÍSLO: 170313

C3 - STANDARD LINE
